Vorläufiger Planungszeitenplan zum Bauvorh. : Grundschule Langendamm

Planung | **Sanierung Westtrakt (Flure werden nach Einbau Aufzug/Neubau Aula fertiggestellt)** | **Stand : 16.06.2020**

Bauherr : Stadt Nienburg/Weser
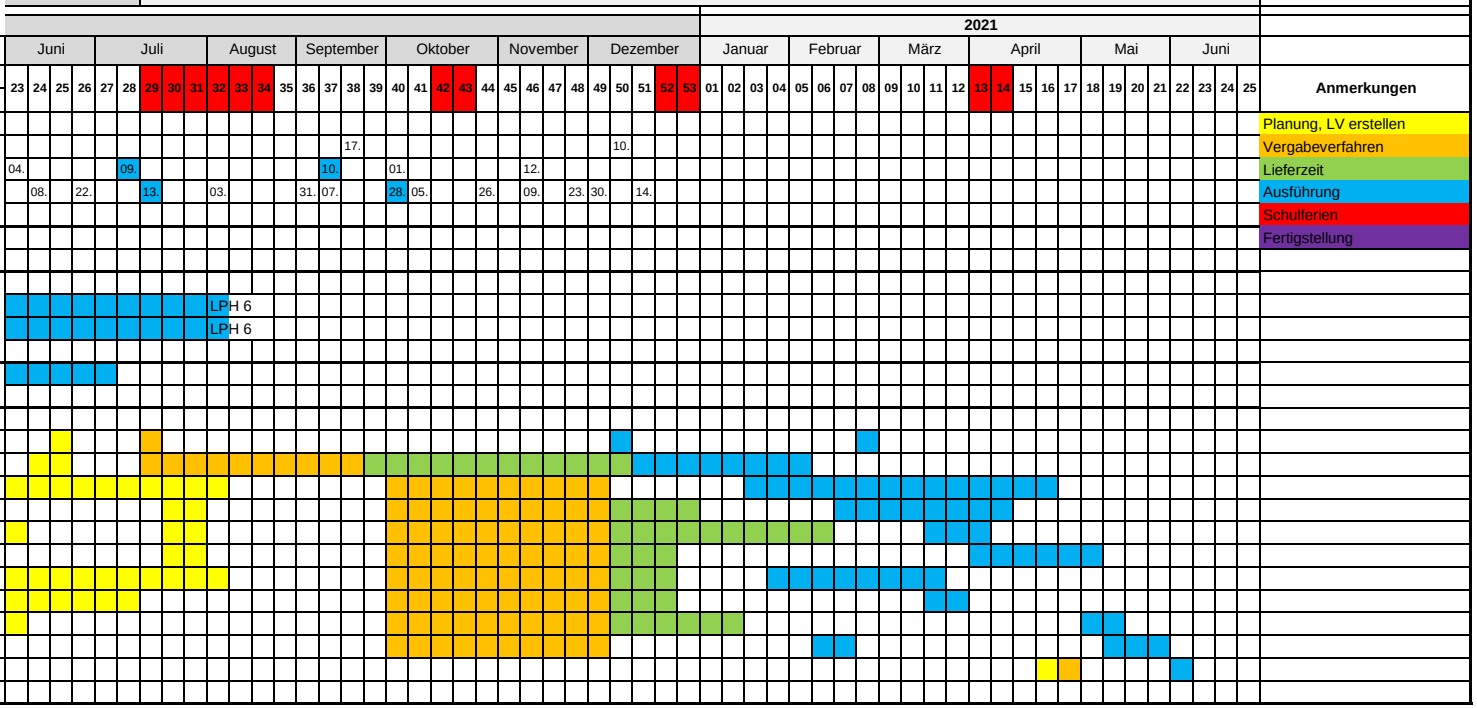
Nr.	Leistung	Auftragnehmer	Jahr 19-21 / Woche	Anmerkungen
00	Ausschüsse u. Gremien	Ortsrat Lgd	17. / 10.	
		BA	04. / 09. / 10. / 01. / 12.	
		VA	08. / 22. / 13. / 03. / 31. / 07. / 28. / 05. / 26. / 09. / 23. / 30. / 14.	
		Rat		
01	Entwurfsplanung	Kostenschätzung		
		Grundrisse, Raumbuch		
02	Fachplaner beauftragen	BSK + FW-Pläne (gesamte Schule)		
		Elektro Sanierung (gesamte Schule)	LPH 6	
		Sanitär Sanierung (West- u. Osttrakt, Neubau Aula)	LPH 6	
		Heizung/Stadtwerke		
03	Genehmigungs-planung	Brandschutzkonzept		
04	Ausschreibungen	**1. BA : Sanierung Westtrakt**		
		Gerüstbauer		
		Fensterbauer		
		Elektriker		
		Trockenbauer		
		Metallbauer (BS-Türen)		
		Bodenleger		
		Sanitärarbeiten (Rohre + Beh. - WC)		
		Fliesenleger (Beh. - WC)		
		Tischler (Türen)		
		Maler + Innenputz		
		Gebäudeendreinigung
